

令和 4 年 3 月度 安全工程表

西土第39号 主要地方道新潟中央環状線(板井地内その5)
 工事名 道路改良工事(新潟市西区板井地内)

工 期 令和3年11月5日 ~ 令和3年3月31日

3 月 度 工 事 安 全 目 標

- ・ 車輛系機械事故の防止
- ・ クレーン災害の防止
- ・ 転落・転倒災害の事故防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
本田 友幸	本田 友幸	本田 友幸

工種	日 曜 日							日 曜 日							日 曜 日							施工業者名	施工上の留意・注意点										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
※※道路改良工事※※																																	
仮設工(敷鉄板設置撤去)																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること
道路側溝PU300A																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること
自由勾配側溝(左側)																																(株)西方組	転倒転落に注意すること
集水柵600×600																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意
集水柵1000×1000																																(株)西方組	吊荷の落下に注意すること
BFB300																																(株)西方組	重機の作業範囲に注意
BFB400																																(株)西方組	転倒転落に注意すること
構造物撤去工 コンクリート																																(株)西方組	転倒転落に注意すること
ボックスカルバート																																(株)西方組	地下埋設物に注意すること
道路土工 掘削																																(株)西方組	地山の状態を確認すること
路体盛土																																秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
交通誘導警備員																																秋葉建設興業	重機の作業範囲に注意
																																Jセキュリティ	一般車に注意すること

週 間 安 全 目 標	・ 車輛系事故の防止	・ 車輛系事故の防止	・ クレーン災害の防止	・ 車輛系事故の防止	左に同じ
予 想 さ れ る 危 険 危 害	・ 地山土留めの点検する ・ 重機との接触に注意する	・ 地下埋設物に注意する ・ 重機との接触に注意する	・ 吊り荷の落下に注意する ・ ワイヤロープの点検	・ 重機との接触に注意する ・ ダンプの路肩から転落	左に同じ 左に同じ

主 要 工 事 機 械	・ バックホウ(0.8m3) 2台 ・ バックホウ(0.4m3) 2台 ・ ダンプトラック(4t) 2台	・ バックホウ(0.2m3) 2台 ・ ダンプトラック(10t) 2台 ・ コンバインドローラー(4t) 1台
-------------	--	---


安 全 衛 生 行 事 等	休 工 休 工 休 工 休 工 休 工	休 工 休 工 休 工	休 工 休 工	休 工 休 工
---------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------

- 【打合せ事項】
- ・ 仮栈橋の共有協議
 - ・ NO. 295+10 境界付近の工程調整
 - ・ 踏みかけ版設置後の敷鉄板搬出

特記事項

- ・ 3月ワイヤー点検色

赤

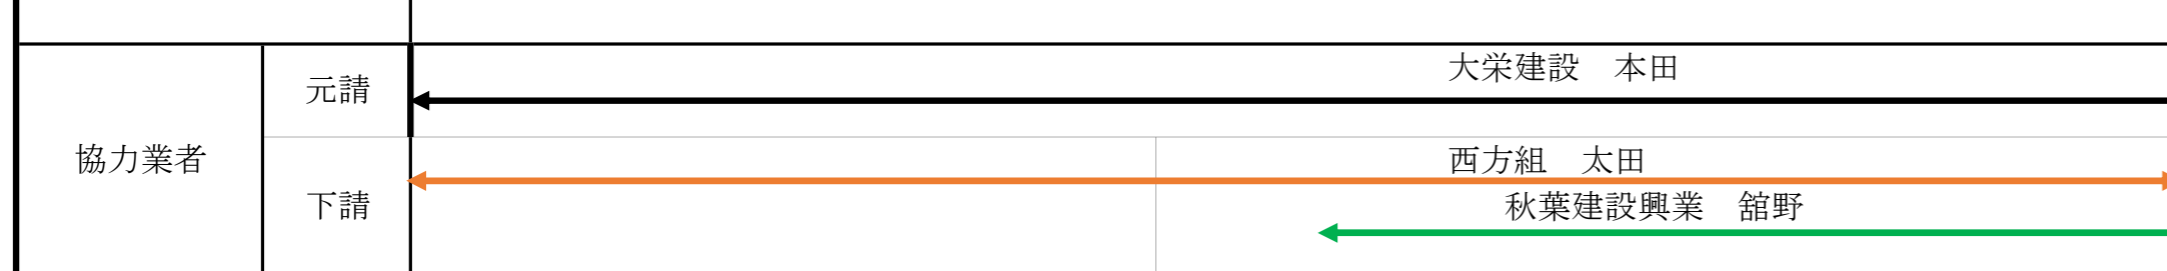

工程実施状況		計画	%	実施	%
1月までの進捗率		5.0	%	5.5	%
2月までの進捗率		24.6	%		%
3月までの進捗率		45.4	%		%
			%		%
