北建第123号
主要地方道新潟新発田村上線（新崎2丁目外地内）舗装工事
新潟市北区新崎2丁目外　地内

工期　着工 2019年10月15日
完成 2020年 3月13日

新潟市北区役所建設課
樺沢　隆紀

株式会社　大栄建設
羽下　伸行
榎本　守

工種	種別	単位	数量	構成比率
主要地方道新潟新発田村上線（新崎2丁目外地内）舗				
準備・測量		式	1.0	1.8
切削オーバレイ工				
	切削オーバレイ	m2	(4,090.0) 8,000.0	(39.6) 84.8
	切削オーバレイ（タックコート無）	m2	(3,150.0)	(30.1)
	クラック防止シート張	m	(0.0) 225.0	(0.0) 0.5
	殻運搬	m3	(362.0) 400.0	(1.4) 1.6
	殻処分	t	(851.0) 940.0	(2.9) 3.5
クラック抑制工				
	じょく層工	㎡	(3,150.0)	(14.3)
区画線工		式	1.0	(4.0) 3.7
仮設工				
	交通誘導警備員	人目	(87.0) 48.0	(4.6) 2.8
後片付け		式	1.0	1.3

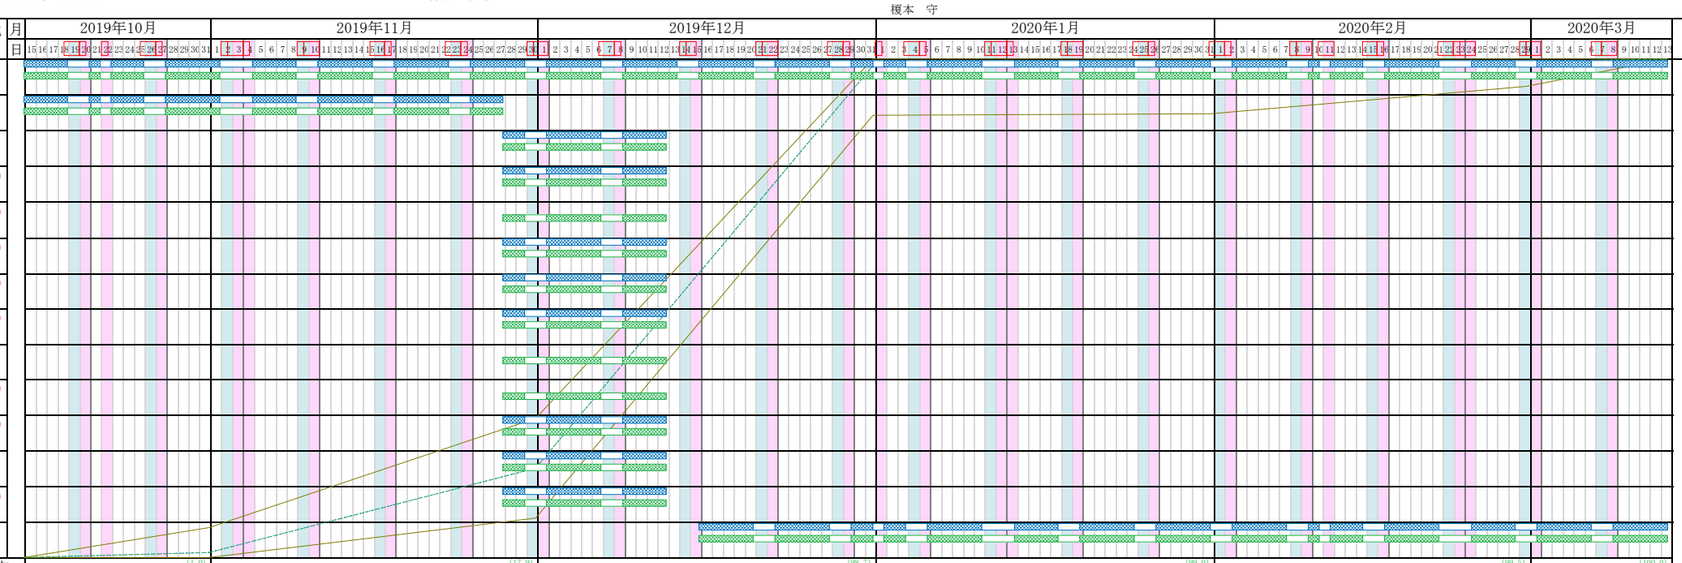

全体工程
予定
実施

機械

機械名	数量	
タイヤローラ　8～20t	1	1.0
アスファルトフィニッシャー　5m	1	1.0
ロードローラー　10～20t	1	1.0
路面切削機　2m	1	1.0
ダンプトラック　10t	6	6.0
コンバインドローラー　4ｔ	1	1.0
エマルジョンフィニッシャー		1.0

労務

計画人員	合計	278 人
変更人員	合計	315 人
実施人員	合計	0 人



安全管理

摘要

施工進度管理
予定
変更予定
実施

全体工程管理
予定
変更予定
実施
限界
