工事番号　工老支3第38号　（計画・変更・実施）　施工者　株式会社 大栄建設

工 事 名　配水管布設工事

工事期間　令和4年2月7日～令和4年8月31日　（206日間）

出来高比率 %

工種	細目	単位	数量	構成率
準備工	計画	式	1.0	2.5
配水管布設工	HPPEφ75	m	115.9	38.5
	GX・K.DIPφ150	m	102.9	
	GX・K.DIPφ100	m	10.7	
仕切弁設置工	φ150	箇所	4.0	3.9
	φ100	箇所	1.0	
消火栓設置工	φ75×φ75	箇所	1.0	1.4
給配水管接続工	φ50～φ13	箇所	16.0	5.8
仮設配水管布設・撤去工	SUSφ100(レンタル管)	m	218.0	21.8
	仮設給配水管接続工(φ50～φ20)	箇所	16.0	
配水管撤去工	CIPφ250	m	74.1	1.4
	CIPφ200	m	6.2	
	CIPφ150	m	22.6	
	CIPφ100	m	126.6	
路面本復旧工	県道C交通	㎡	148.5	11.8
	県道歩道	㎡	12.5	
	市道A断面	㎡	60.0	
	市道C断面	㎡	650.0	
	市道歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	㎡	130.0	
	区画線設置工	m	145.7	
附帯工	特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置･撤去工	㎡	15.0	1.5
後片付け・その他(試掘他)		式	1.0	14.0
				100
進捗率				予定 0.5% 2.2% 8.7% 35.5% 67.2% 87.3% 100.0%
				変更
				実施
記事				契約日 着手日 完了日

機械計画			
バックホウ0.10m3級		台	2
ダンプトラック2・3・4ｔ		台	3
ハンドガイドローラー		台	1
ランマー・プレート		台	2
アスファルトフィニッシャ		台	1
ロード・タイヤローラー		台	1
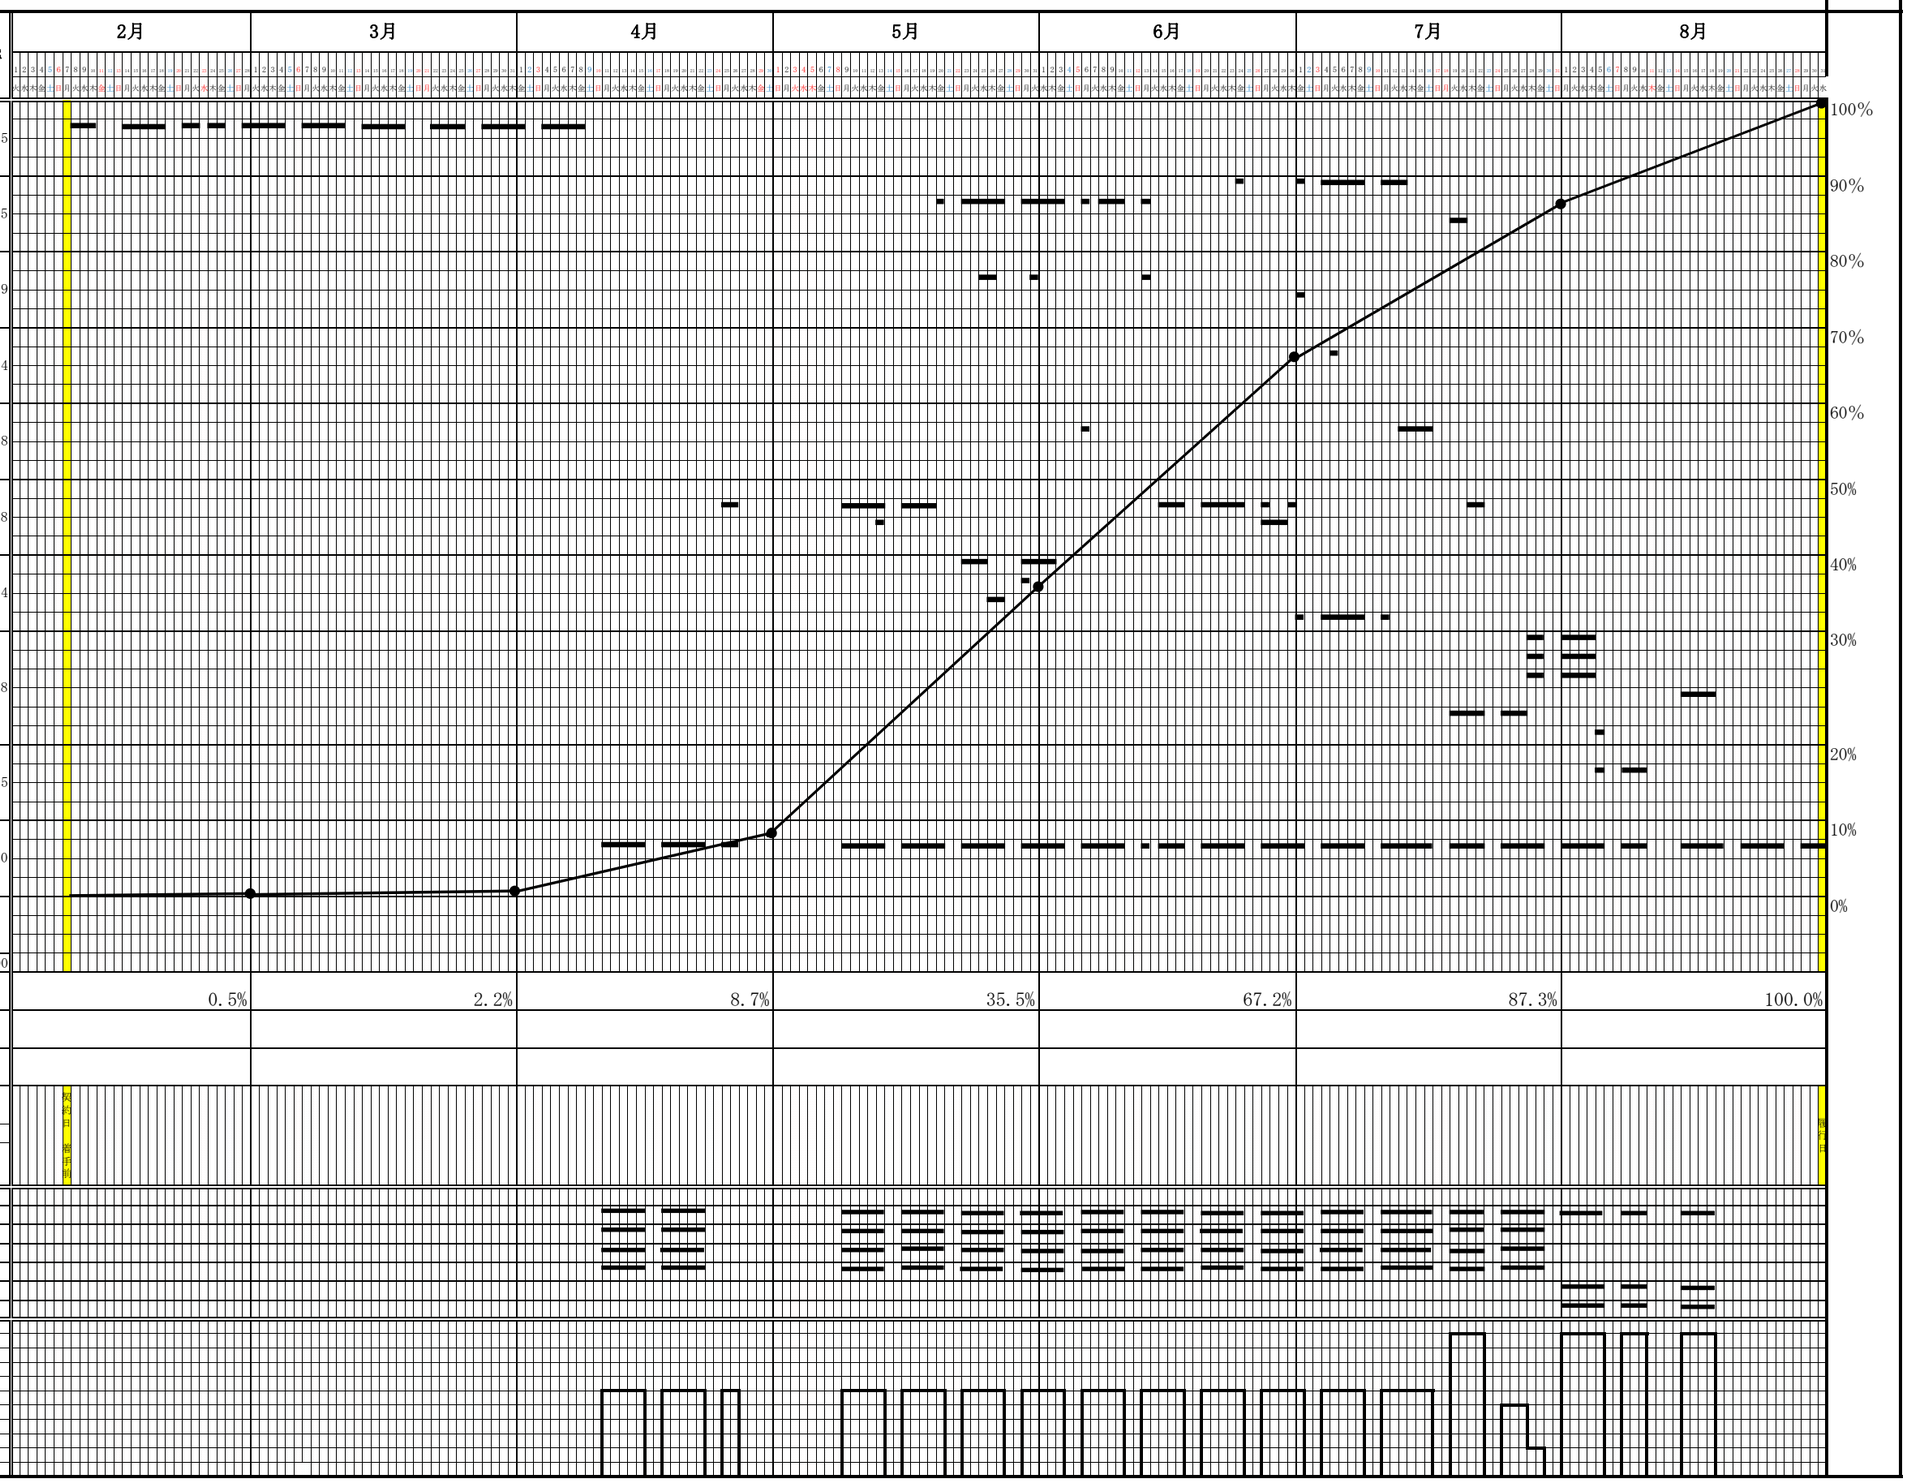
人員計画		人	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
