令和　7　年　　2月度　　安 全 工 程 表

2月 度 工事安全目標

- 車輌系機械事故の防止
- 交通災害の防止
- 第３者災害防止

工　事　名	新潟港（東港区）臨港道路中央ふ頭（西）３号道路改良その２工事 （新潟市北区太郎代地内）
工　　期	令和6年10月11日　～　令和7年3月31日

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
横内　茂則	湯浅　誠一		湯浅　誠一

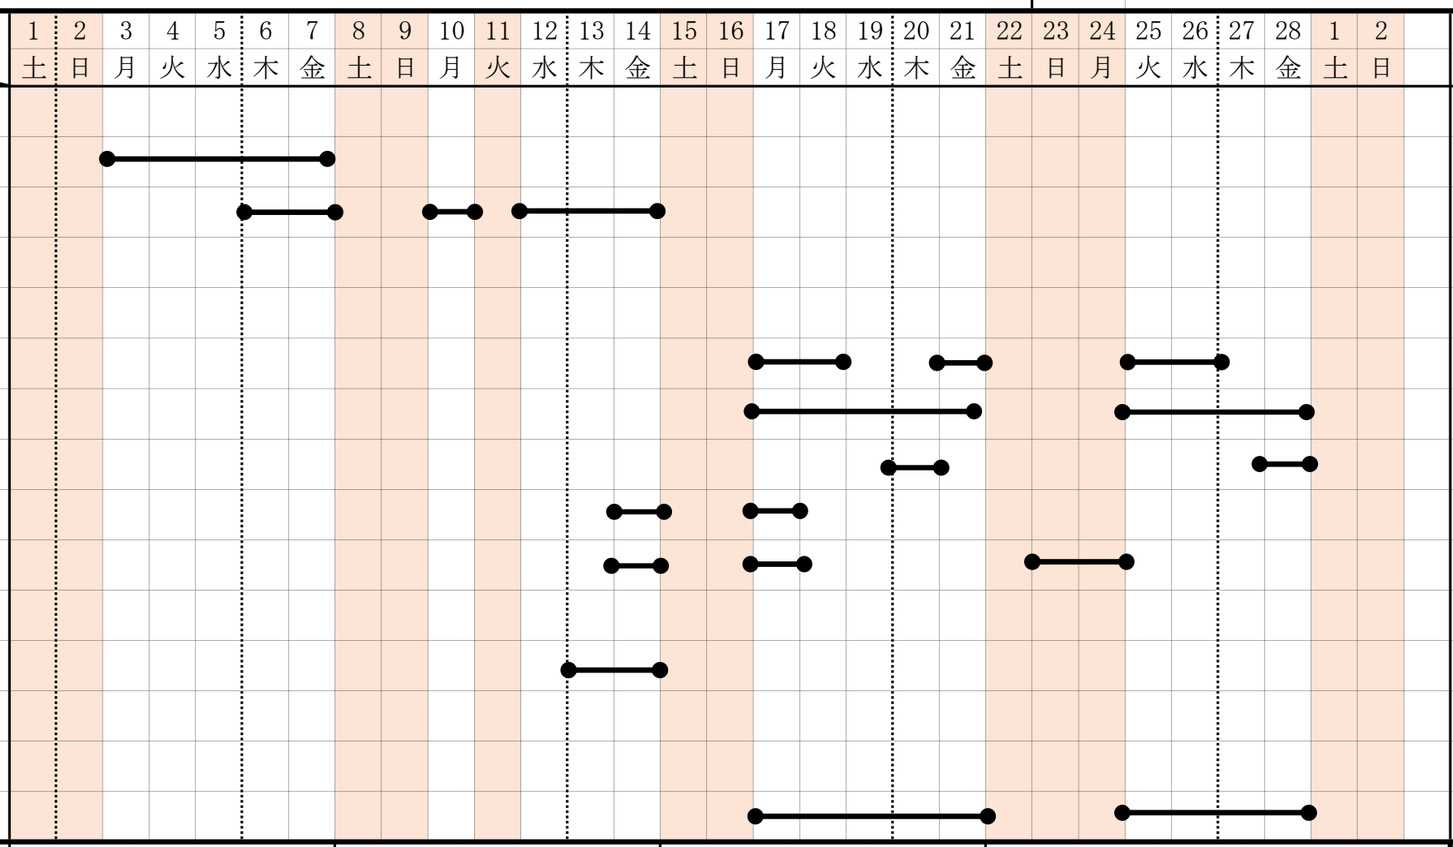

工種	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※護岸工事※※		
準備工(計画、打合せ)	㈱大栄建設	
準備工(安全施設等)	㈱アルバ建設	手足元に注意すること
道路土工　掘削工		
擁壁工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁		
排水構造物工　作業土工	㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
側溝工	㈱アルバ建設	荷の落下に注意すること
集水桝工	㈱アルバ建設	地下埋設物接触に注意すること
構造物撤去工　構造物取壊し	㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
舗装版取壊し	㈱アルバ建設	手足元に注意すること
防護柵撤去	未定	
舗装切断	㈲日昇	
舗装工　下層路盤		
縁石工　歩車道ﾌﾞﾛｯｸ		
交通誘導警備員	Jｾｷｭﾘﾃｨ	第３者車両に注意すること

週間安全目標	予想される危険危害	主要工事機械	安全衛生行事等
・交通災害の防止	・車両同士の衝突 ・第3者との接触に注意すること	・バックホウ(0.25m3)　1台 ・4tダンプトラック　1台	休工　休工
・交通災害の防止	・車両同士の衝突 ・第3者との接触に注意すること	・バックホウ(0.2m3)　1台 ・10tダンプトラック　1台	休工　休工　休工
・車両系事故の防止	・重機との接触に注意する ・吊荷落下に注意すること		休工　休工
・車両系事故の防止	・吊荷の落下に注意する ・重機との接触に注意する		休工　休工　休工
			休工　休工

【打合せ事項】

特記事項

・2月ワイヤー点検色　**黄**

協力業者	
元請	大栄建設　横内
下請	㈱アルバ建設　宮川
	有限会社　日昇

工程実施状況

	計画	実施
12月までの進捗率	2.5 %	2.0 %
1月までの進捗率	15.9 %	3.0 %
2月までの進捗率	37.0 %	%
	%	%
