工事番号：港海メン 第1801-92-00-01号
工事名　：新潟港海岸(松浜地区)西埋立地護岸水叩き復旧(その2)工事

工事期間　令和 6年 7月 8日 から
令和 7年 2月 12日 まで

施工箇所：新潟市北区太郎代 地内

請負者名　：株式会社　大栄建設
主任技術者：湯浅　誠一
現場代理人：神　幸雄
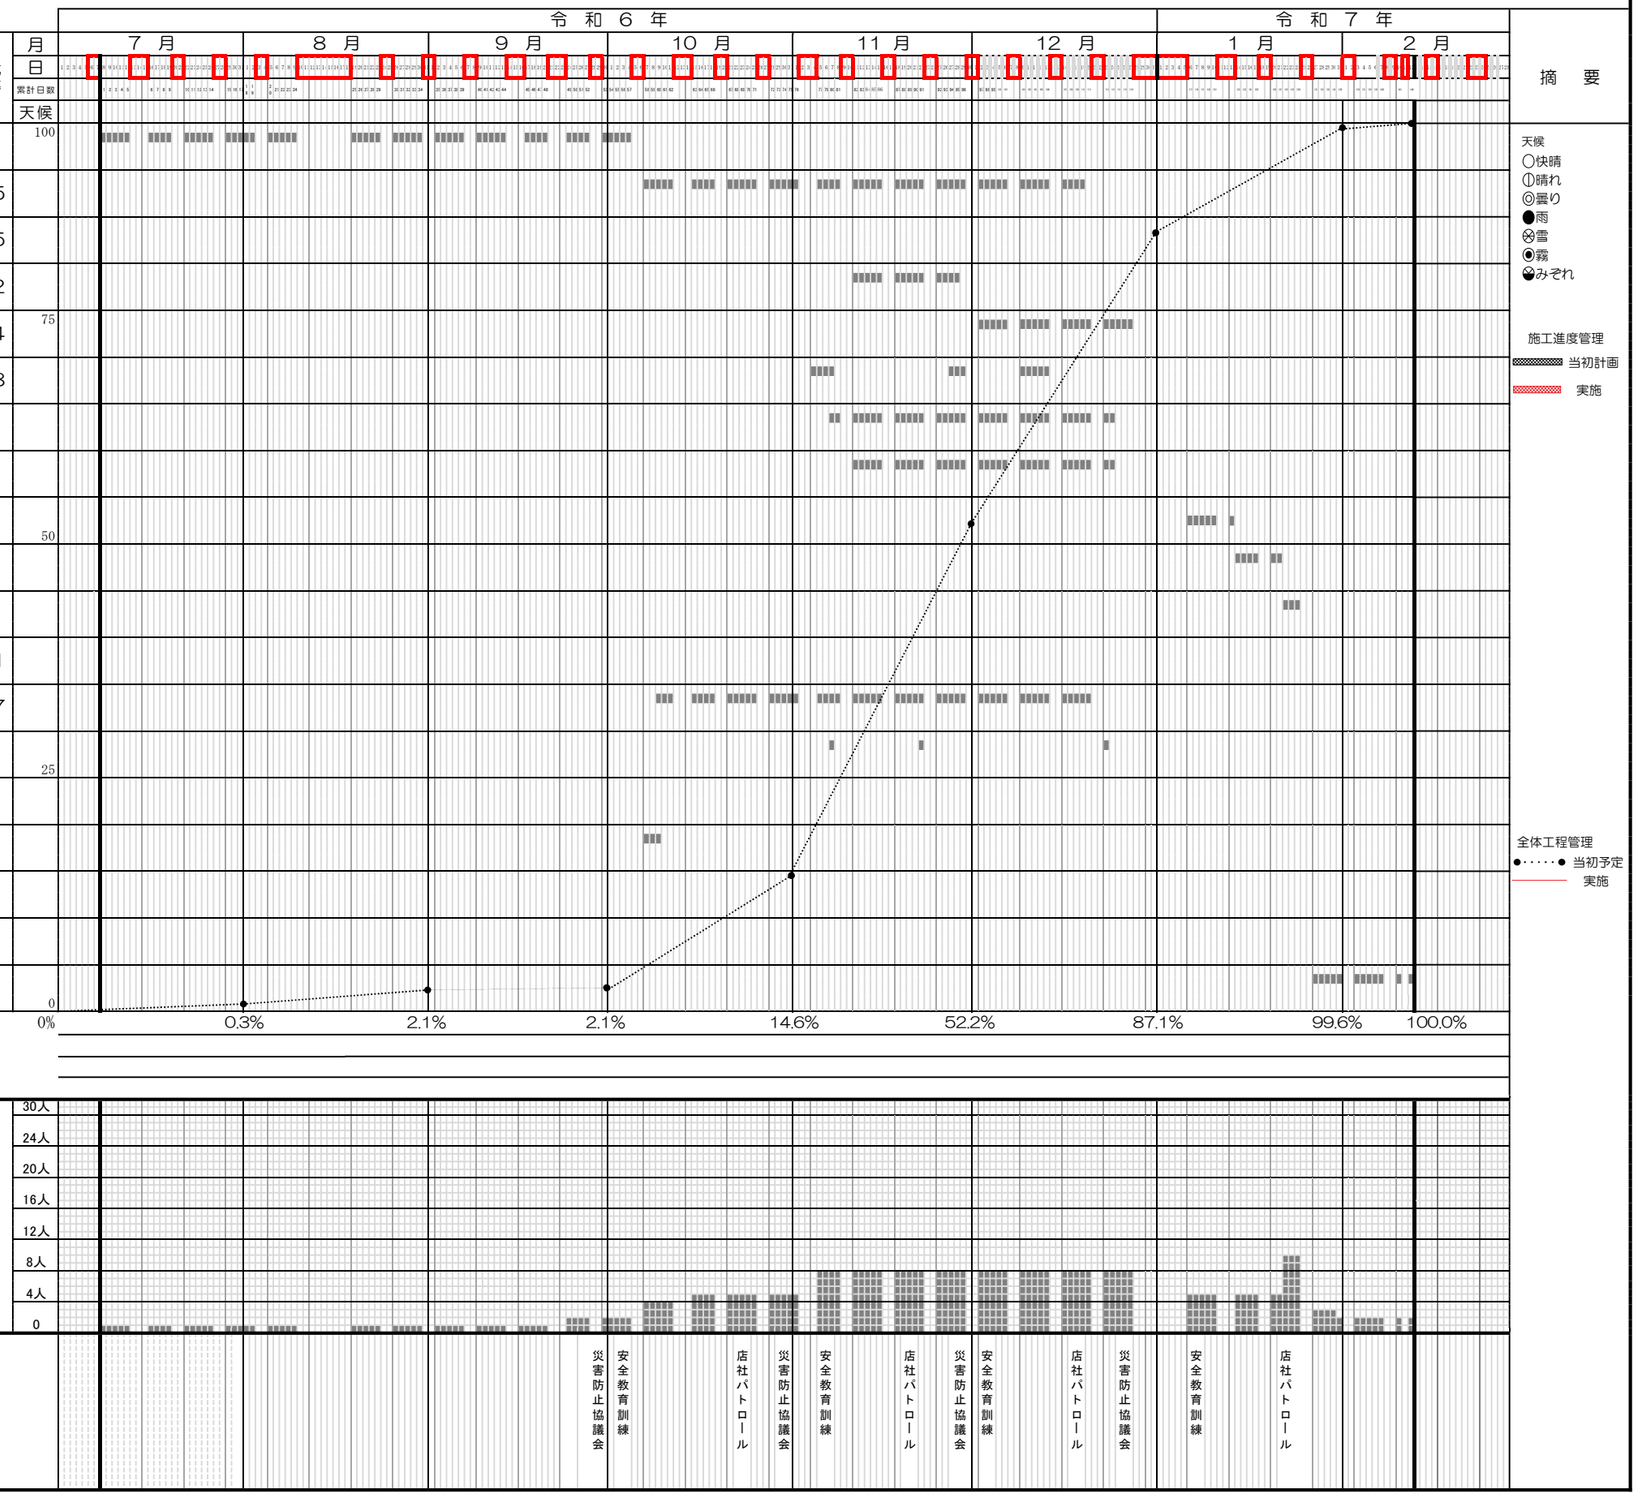
工　種	種別・細別	単位	数量	構成比率
準備工	現地踏査・設計照査・施工計画・測量・工事PR・安全施設設置・材料発注	式	1.0	3.0
作業土工(埋戻工)	捨石・表面均し・埋戻し・積込、運搬	式	1.0	12.5
舗装工		式	1.0	58.5
水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	簡易機械舗設	㎡	497.0	15.2
	人力舗設	㎡	430.0	14.4
	路盤材敷均し転圧（人力）	㎡	927.0	10.8
	鋼製型枠設置撤去	m	220.0	1.2
	施工目地	m	778.0	4.0
アスファルト舗装	下層路盤（人力）	㎡	534.0	3.8
	上層路盤（人力）	㎡	534.0	4.4
	表層（機械舗設）小規模	㎡	534.0	4.7
排水工		式	1.0	27.1
	自由勾配側溝（1～3工区）	m	246.0	18.7
	蓋版設置	枚	492.0	8.4
構造物撤去工		式	1.0	1.9
暗渠配水管撤去	波状管及び網状管　450～600㎜	m	39.0	1.9
後片付け	細部仕上げ・後片付け	式	1.0	1.0
			当初計画
