変更2回目計画（実施）工程表

工事名　：新潟港(東港区)南ふ頭障壁・埋設管路設置(その1)工事

工事期間　令和 7年 3月 5日 から
令和 7年 9月 30日 まで

施工箇所：新潟県北蒲原郡聖籠町東港4丁目 地内

請負者名　：株式会社　大栄建設
主任技術者：本田　友幸
現場代理人：横内　茂則

工　種	種　別　・　細　別	単位	数　量	構成比率	摘　要
準備工	現地踏査・設計照査・施工計画・測量・工事PR・安全施設設置・材料発注	式	1.0	0.9	
基盤整備		式	1.0	4.9	
敷地造成工	掘削、敷砂利撤去、土砂運搬、整地	m3	570.0	2.5	
構造物撤去工	コンクリート切断、構造物取壊し	式	1.0	2.1	
	コンクリート殻運搬処理	式	1.0	0.3	
施設設備		式	1.0	95.1	
電気設備工	作業土工　掘削・埋戻し	m3	330.0	9.3	
	ハンドホール600×600×900 中耐蓋付	基	16.0	10.3	
	電線管路工 波付硬質ポリエチレン管 FEPφ50㎜	m	658.0	3.1	
管理施設整備工	基礎ブロック　250×250×500	基	331.5	6.3	
	支柱・金網・有刺鉄線設置	㎡	663.0	30.3	
遠路広場整備工	石材系舗装工　基面整正 グリズリーアンダー	㎡	3519.0	10.9	
	防草シート設置工	㎡	3519.0	23.9	
管理施設整備工(東側)	支柱・金網・有刺鉄線設置	m	10	-	
後片付け	細部仕上げ・後片付け	式	1.0	0.2	

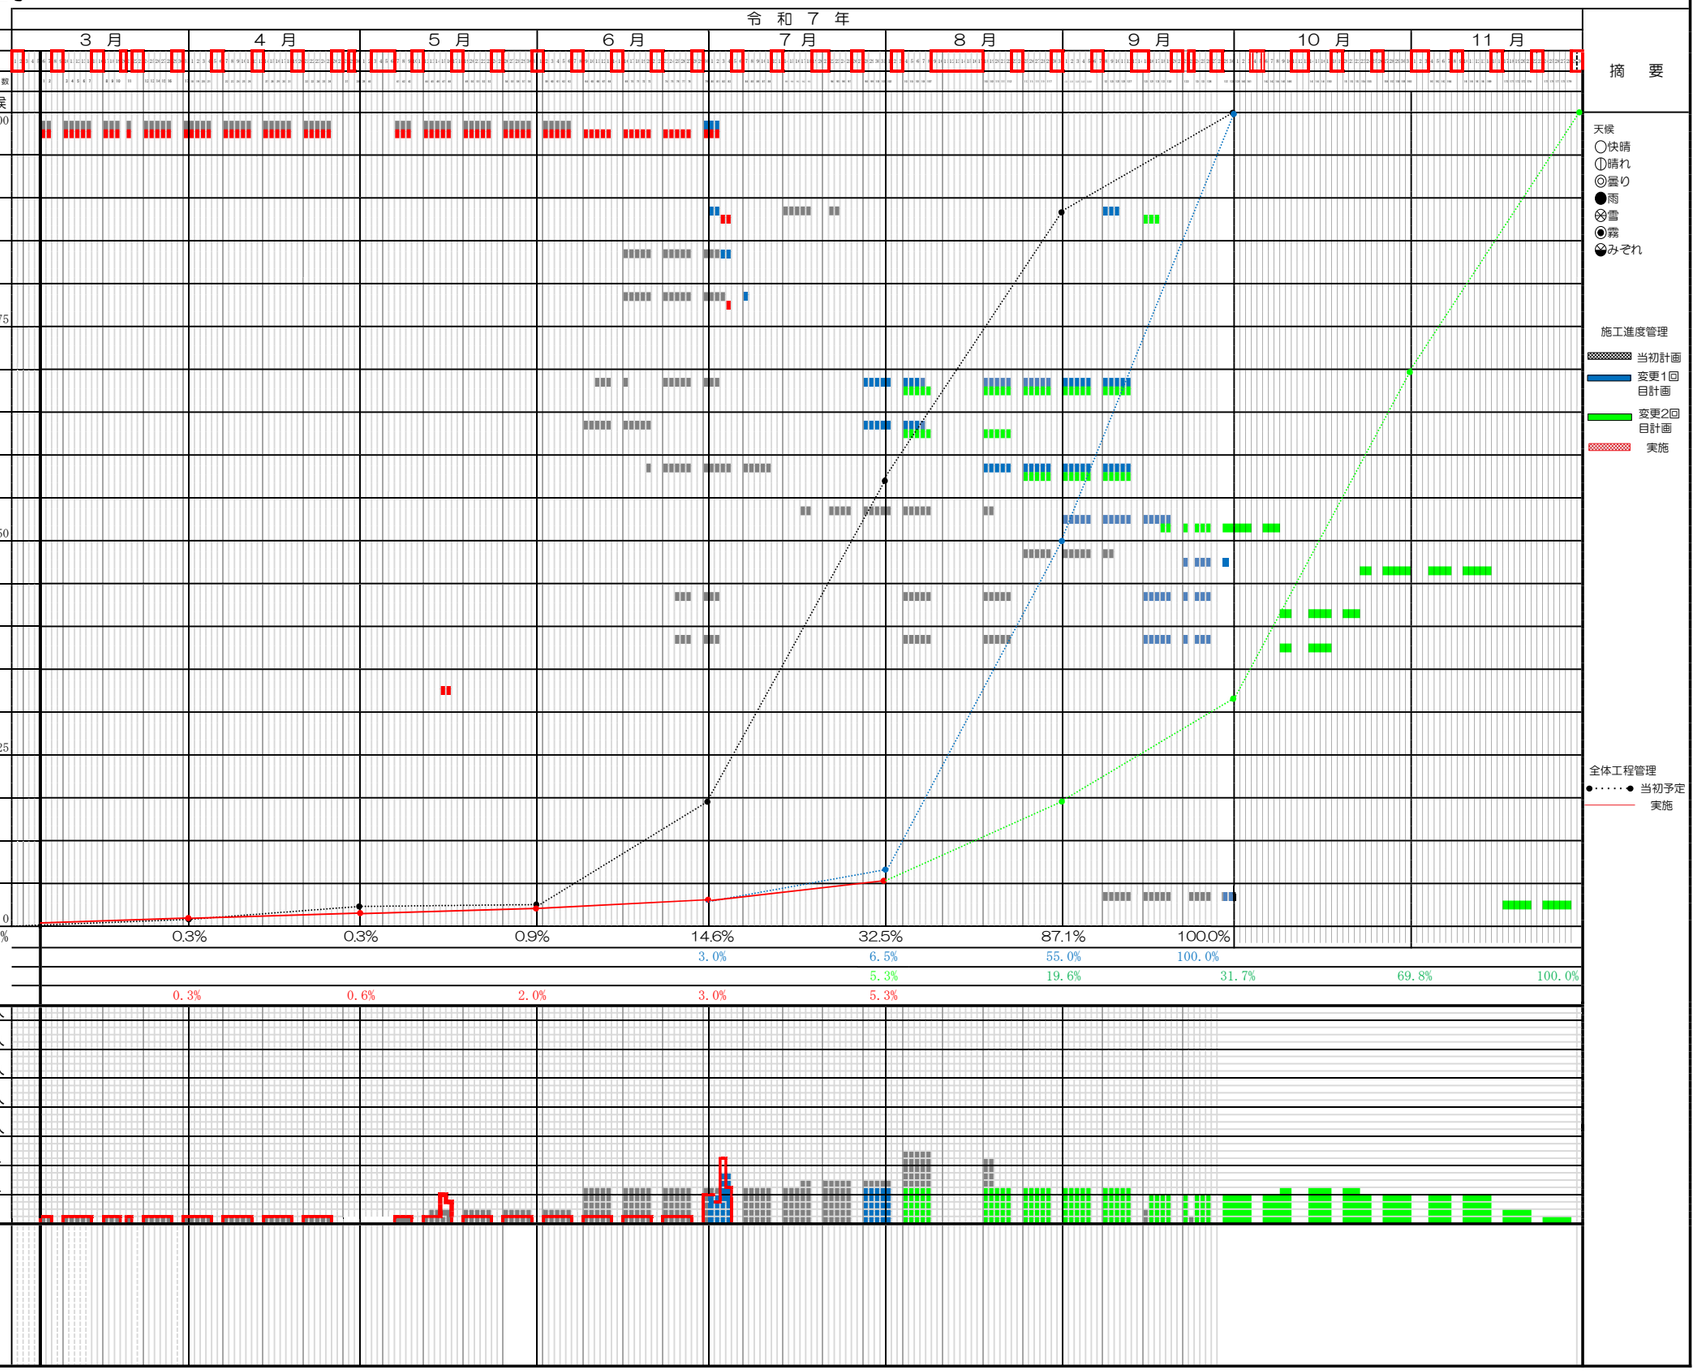

全体工程進捗率								
当初計画	0%	0.3%	0.3%	0.9%	14.6%	32.5%	87.1%	100.0%
第１回変更計画					3.0%	6.5%	55.0%	100.0%
実施		0.3%	0.6%	2.0%	3.0%	5.3%	19.6%	31.7%	69.8%	100.0%
