令和　7　年　11月度　　安 全 工 程 表

新潟港(東港区)南ふ頭障壁・埋設管路設置（その１）工事

工　事　名　（北蒲原郡聖籠町東港４丁目地内）

工　　期　令和7年3月5日　～　令和7年11月29日

工事安全目標

・ 車輌系機械事故の防止

・転落・転倒災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者		作成者
横内　茂則	本田　友幸		本田　友幸

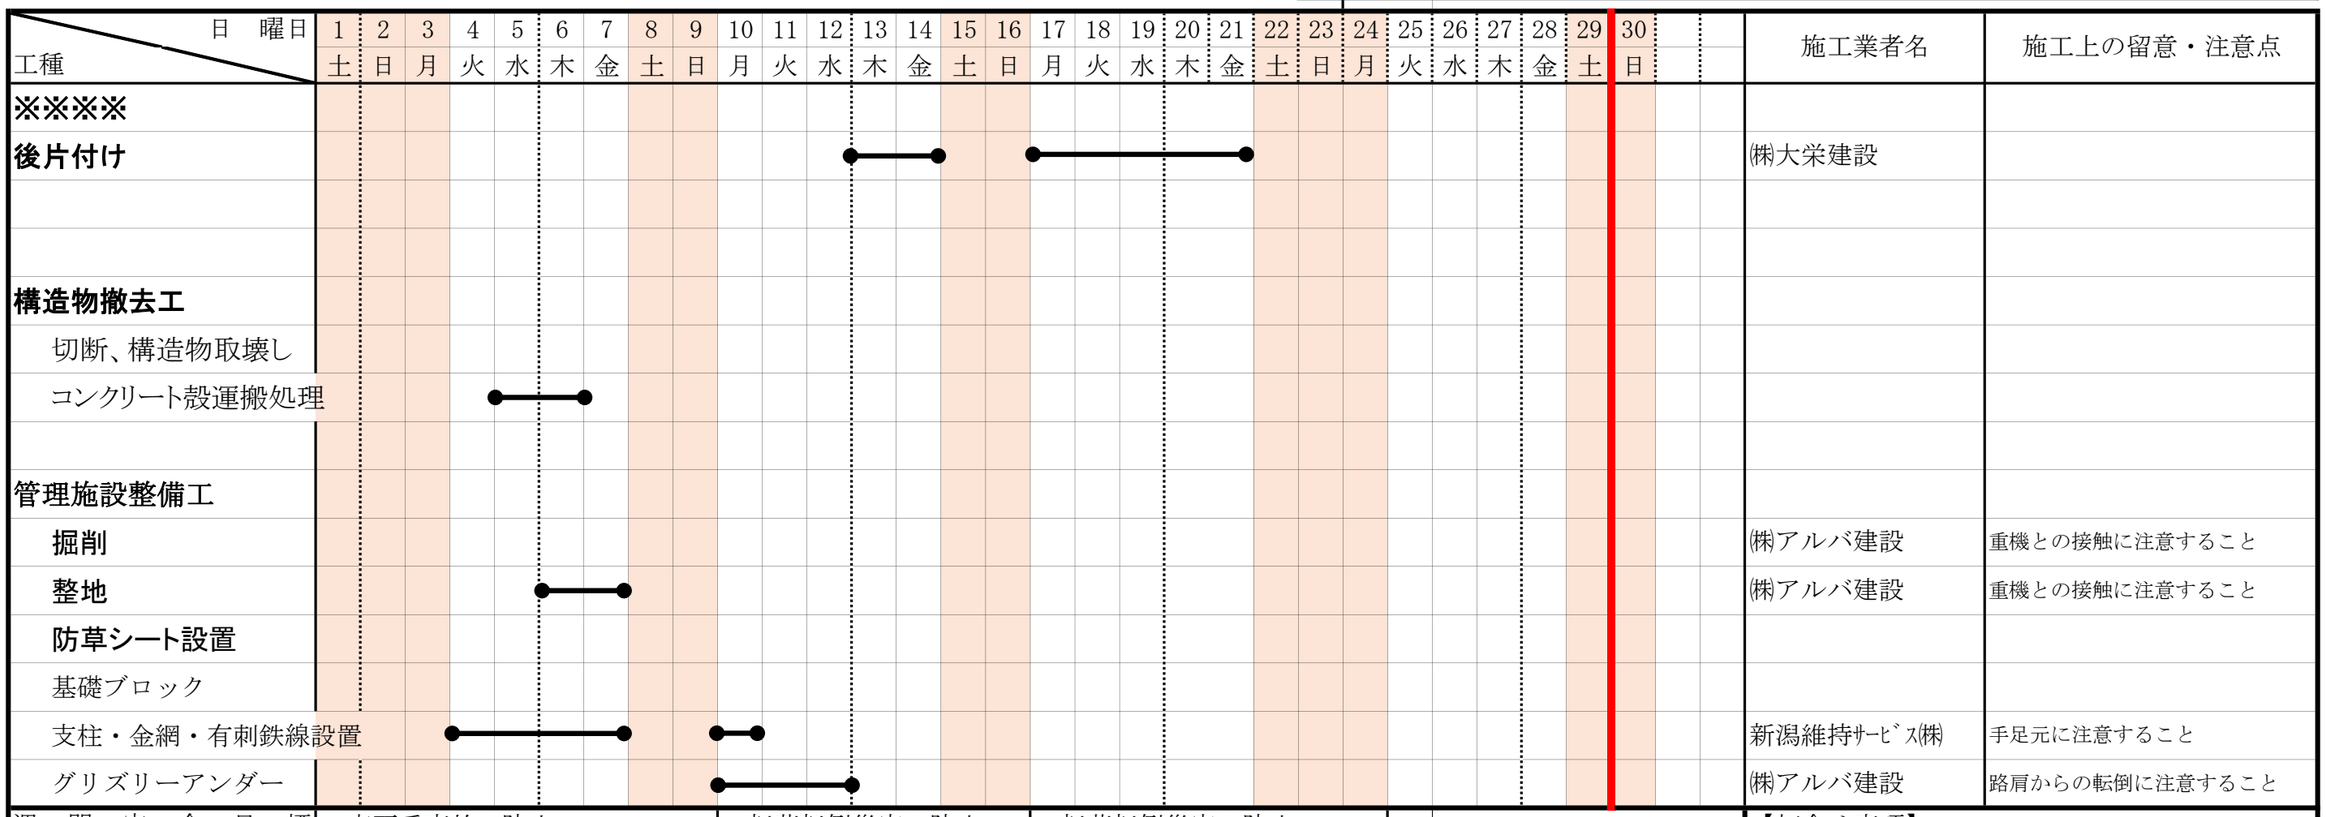

工種	施工業者名	施工上の留意・注意点
※※※※		
後片付け	㈱大栄建設	
構造物撤去工		
切断、構造物取壊し		
コンクリート殻運搬処理		
管理施設整備工		
掘削	㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
整地	㈱アルバ建設	重機との接触に注意すること
防草シート設置		
基礎ブロック		
支柱・金網・有刺鉄線設置	新潟維持ｻｰﾋﾞｽ㈱	手足元に注意すること
グリズリーアンダー	㈱アルバ建設	路肩からの転倒に注意すること

週間安全目標	・車両系事故の防止	・転落転倒災害の防止	・転落転倒災害の防止
予想される危険危害	・重機との接触に注意する ・手足元に注意すること	・重機との接触に注意する ・転落に注意すること	・手足元に注意すること ・転落に注意すること
主要工事機械	・バックホウ(0.45m3)　1台 ・4tダンプトラック　2台 ・4tユニック　1台	・バックホウ(0.1m3)　0台	・バックホウ(0.25m3)　1台
安全衛生行事等	休工 休工 休工	休工 休工	休工 休工 休工

【打合せ事項】

・転用品の不使用状況の確認

特記事項

・11月ワイヤー点検色　赤

協力業者		
	元請	大栄建設　本田
	下請	㈱アルバ建設　馬場
	下請	新潟維持ｻｰﾋﾞｽ㈱　山崎

工程実施状況

（変更）	計画	%	実施	%
7月までの進捗率	32.5 (5.3)	%	5.3	%
8月までの進捗率	87.1 (19.6)	%	18.6	%
9月までの進捗率	100 (31.7)	%	31.9	%
10月までの進捗率	(69.8)	%	89.0	%
